



GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZACION DE PAGO DE OBRA

L.A. MARCO ANTONIO VELEZ GOMEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

CONTRATISTA	RICARDO RODRIGUEZ NIETO
OBRA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KILOMETRO 3.8 DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO
FECHA	viernes, 4 de diciembre de 2015

POR ESTE CONDUCTO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ESTIMACION DOS
POR UN MONTO TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE:
\$ 30,000.00

RECURSO	PROPIOS
CONTRATO N°	SMA-OPM-FP-2015-01
N° DE FACTURA	17
RETENCION 5 AL MILLAR (PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA)	
RETENCION 2 AL MILLAR (POR CAPACITACION CMIC)	

NETO A PAGAR \$ 30,000.00



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
LARIOS RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ING. GABRIEL MARQUEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
MIGUEL MARINO SANCHEZ DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA



HUMBERTO HERNANDEZ REYNOSO
CONTRALOR MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
CONTRALORIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RFC Emisor : RONR790915S33

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle LOPEZ MATEOS No. Exterior 54 Colonia EL PUENTE Localidad
TEOCALTICHE Municipio TEOCALTICHE Estado Jalisco MEXICO CP. 47200

Sucursal :

RFC Receptor : MSM220422E73

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

Calle PORTAL INDEPENDENCIA No. Exterior 4 Colonia S/C Localidad SAN
MIGUEL EL ALTO Municipio SAN MIGUEL EL ALTO Estado Jalisco MEXICO
CP. 47140

Folio Fiscal:

439F6D9D-B802-4F05-8BB2-C16C3D21742B

No de Serie del CSD:

00001000000203518944

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TEOCALTICHE JALISCO 2015-12-04T10:36:50

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

17

Régimen Fiscal:

Regimen de las personas físicas con actividad
empresarial y profesional

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
283.50	N/		MTS.3 CUBICOS DE TENDIDO DE CASCAJO, EXTRACCION, CARGA, DESCARGA Y ACARREO DEL MISMO (3RA. ESTIMACION)	86.87	24627.645
670.81	N/A		MTS.2 CUADRADOS DE NIVELACION DE SUBRASANTE CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE DRENES LATERALES (3RA. ESTIMACION)	1.84	1234.2904

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 25,861.94

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE

IVA 16.00% \$ 4,138.06

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

TOTAL \$ 30,000.00

Total con letra:

TREINTA MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

iz80uRYS0tnWC/QDOqPAXmjb8BgQM5ATYAkDApzs+pq0jX+NzhwW2rn1xWaG34q8m2YObSVkM+ZVWB52nmVn34MZZbkgYCO8gOeGRrQ+NNaABokNfG
+nA7T64BALmbeZngnc/6wpjusSpWLZzwucwyUeVhsBoTJGy5sopU9ng8=

Sello del SAT:

TY7IkXmB3IEHxoHPs9BAw8sSOH2og1Aqla5hgR51k95IfG/WSas/1POzFezIMxakn400xN7LkAg
+k4DiCuDmwKBKPIYdZB3nNNoqNpMkafWplcfBgeYlo62YPp7nb9bcd2yaMCRXN/SZLh821TuPbcKwwRKN0IXPayLBVeDGro=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|439F6D9D-B802-4F05-8BB2-C16C3D21742B|2015-12-04T10:42:34||iz80uRYS0tnWC/QDOqPAXmjb8BgQM5ATYAkDApzs+pq0jX+NzhwW2rn1xWaG34q8m2YObSVkM+ZVWB52nmVn34MZZbkgYCO8gOeGRrQ+NNaABokNfG
+nA7T64BALmbeZngnc/6wpjusSpWLZzwucwyUeVhsBoTJGy5sopU9ng8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-04T10:42:34



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No.

DOS

FECHA DE INICIO

20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO

04 DE DICIEMBRE DEL 2015

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KM 3.8 DE LA CARRETERA, SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO MPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION

PERIODO DEL EJECUCION

23 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015

UBICACIÓN :

SAN MIGUEL EL ALTO

ASIGNACION No.

SMA OP FP 2015 01

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO

IMPORTE

NOMBRE OBRA

(A) SUMA TOTAL

\$

25,862.07

(B) SUMA COSTO DIRECTO ESTA ESTIMACIÓN

\$

25,862.07

(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN

\$

25,862.07

(D) 16% DE I.V.A. (0.15 x C)

\$

4,137.93

(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACIÓN (C+D)

\$

30,000.00

(F) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (25.0 %) DE (E)

(G) 5 AL MILLAR

(I) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F))

\$

30,000.00

NETO A PAGAR (I-G)

\$

30,000.00

AVANCES

FISICO

11.59%

FINANCIERO

11.59%

ESTADO CONTABLE

IMPORTE DE CONTRATO

\$

258,912.00

IMPORTE DE ANTICIPO

\$

-

CONTRATO

ANTICIPO

ACUMULADO ANTERIOR

30,000.00

AMORTIZADO ANTERIOR

\$

-

ESTA ESTIMACIÓN

30,000.00

AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN

\$

-

ACUMULADO A LA FECHA

60,000.00

AMORTIZADO ACUMULADO

\$

-

SALDO

198,912.00

SALDO POR AMORTIZAR

\$

-

SALDO QUE SE CANCELA

0.00

LUGAR Y FECHA :

SAN MIGUEL EL ALTO A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
ING. GERARDO MORALES PAZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

ESTIMACION DE OBRA

DOS

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRA: Reconstrucción de Camino Rural
UBICACIÓN: SAN MIGUEL EL ALTO

PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO

NOMBRE

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

CUERPO DE ESTIMACIÓN

PERIODO DE TRABAJO



RCU	CONCEPTO	CANTIDADES						IMPORTES		
		UNI	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADOS ESTIMACIONES
No.										

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO										
1.-	Tendido de material subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (tractocompactor) en capas de 30cm. Incluye carga, descarga y acarreo del mismo.	m3	1,680.00	283.50	283.50	567.00	1,113.00	\$86.87	\$ 24,627.78	\$ 49,255.56
2.-	Nivelación de capa subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (Motoconformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	m2	5,600.00	670.81	670.81	1,341.62	4,258.38	\$1.84	\$ 1,234.29	\$ 2,468.58

SUMA PARCIAL ESTA ESTIMACION	\$25,862.07
16.0 % DEL I.V.A.	\$4,137.93
SUMA TOTAL ESTA ESTIMACION	\$30,000.00



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUÍZ

CONSTRATISTA

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

GENERADORES DE OBRA



GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Reconstrucción de Camino Rural

UBICACIÓN: KM 3.8 de la carretera San Miguel el Alto-Jabototitlán al Relleno Sanitario Municipal.

CONTRATISTA:

Ricardo Rodriguez Nieto

GENERADOR

02

NÚM	CONCEPTO	Localización		pza	Largo	Ancho	Alto	Uni	Result.	P. Unit.	Costo Total
			ejes								
1.-	Tendido de material subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (tractocompactor) en capas de 30cm. Incluye carga, descarga y acarreo del mismo.	0+135	-	0+270	1.00	135.00	7.00	0.30	m3	283.50	\$ 86.87 \$ 24,627.78
2.-	Nivelación de capa subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (Motoconformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	0+095	-	0+190	1.00	95.83	7.00	m2	670.81	\$ 1.84 \$ 1,234.29	
Subtotal = \$											25,862.07
IVA (16%) = \$											4,137.93
Total a Pagar = \$											30,000.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Gerardo Israel Larios Ruíz

Residente de Obra
Ricardo Rodriguez Nieto

Supervisor de Obras Públicas
Ing. Miguel Eduardo Sánchez Díaz






GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Reporte Fotográfico

Reconstrucción de Camino Rural

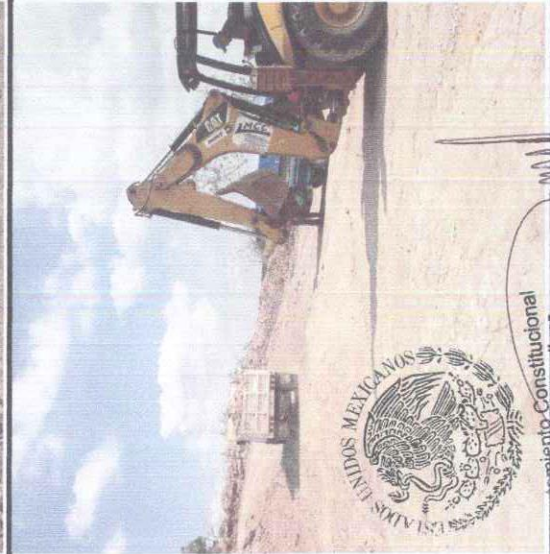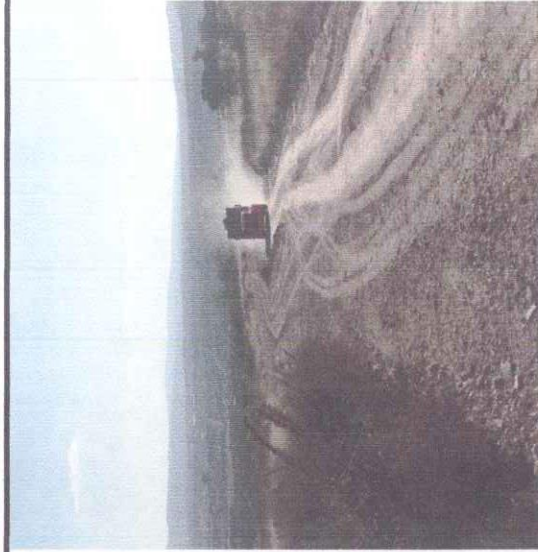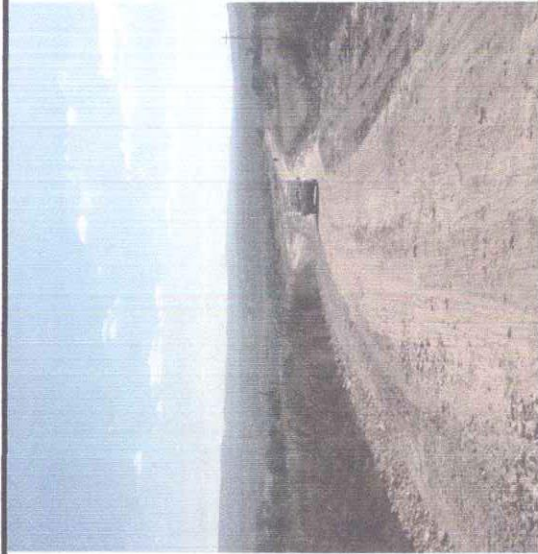

[Firma]

[Firma]
Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco
DIRECCIÓN MUNICIPAL
OBRAS PÚBLICAS
