



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



AUTORIZACION DE PAGO DE OBRA

L.A. MARCO ANTONIO VELEZ GOMEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

CONTRATISTA RICARDO RODRIGUEZ NIETO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KILOMETRO 3.8 DE
LA CARRETERA SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO
MUNICIPAL" EN SAN MIGUEL EL ALTO
viernes, 4 de diciembre de 2015

POR ESTE CONDUCTO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ESTIMACION CINCO
POR UN MONTO TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE:
\$ 30,000.00

RECURSO PROPIOS
CONTRATO N° SMA-OPM-FP-2015-01
N° DE FACTURA 20
RETENCION 5 AL MILLAR (PARA INSPECCION, CONTROL Y
VIGILANCIA)
RETENCION 2 AL MILLAR (POR CAPACITACION CMIC)

NETO A PAGAR \$ 30,000.00



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco
DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. GABRIEL MARQUEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco
DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PARA SU CONCIMIENTO



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
CONTRALORIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RFC Emisor : RONR790915S33

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle LOPEZ MATEOS No. Exterior 54 Colonia EL PUENTE Localidad
TEOCALTICHE Municipio TEOCALTICHE Estado Jalisco MEXICO CP. 47200

Sucursal :

RFC Receptor : MSM220422E73

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

Calle PORTAL INDEPENDENCIA No. Exterior 4 Colonia S/C Localidad SAN
MIGUEL EL ALTO Municipio SAN MIGUEL EL ALTO Estado Jalisco MEXICO
CP. 47140

Folio Fiscal:

F19E6F81-D749-47E0-8831-3BF2F367FECD

No de Serie del CSD:

00001000000203518944

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TEOCALTICHE JALISCO 2015-12-04T14:34:22

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

20

Régimen Fiscal:

Regimen de las personas físicas con actividad
empresarial y profesional

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
283.50	N/A		MTS.3 CUBICOS DE TENDIDO DE CASCAJO, EXTRACCIÓN, CARGA, DESCARGA Y ACARREO DEL MISMO (4TA. ESTIMACION)	86.87	24627.645
670.81	N/A		MTS.2 CUADRADOS DE NIVELACION DE SUBRASANTE CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE DRENES LATERALES (4TA. ESTIMACION)	1.84	1234.2904

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 25,861.94

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE

IVA 16.00% \$ 4,138.06

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

TOTAL \$ 30,000.00

Total con letra:

TREINTA MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

sUalpgGzUhPtoTDXzEUa7RBqju9QHfVx0rHJs/ufKjthHThJ4mjiyhGExtidj7VEMfxcgiRLQq9vX9Z
+3Yx3mymB70sZtyUdp5pn7uFSGUG40jTVzFh3FSSaSkBDwdEFDV7L4Kb1s4aUGOo0seYXlHlQSSegb5oT9kHMyT2A=

Sello del SAT:

dqScU4U60b6OTCj2ujPXUSpkQb9qCo3QlOsL2KIXBBYADqjmuUvWKGFXehhw0RSiZzcJRE3keSJBvGmc5dP45Br5JNGHRmflAOkmtppA042TPH8HC
+HQGrm2RmO9F7aBq9QF29Xsco0KF06f5wWFW1h/FBbFhgP1+Yh0Qqdv+4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]F19E6F81-D749-47E0-8831-3BF2F367FECD[2015-12-04T14:40:52]
sUalpgGzUhPtoTDXzEUa7RBqju9QHfVx0rHJs/ufKjthHThJ4mjiyhGExtidj7VEMfxcgiRLQq9vX9Z
+3Yx3mymB70sZtyUdp5pn7uFSGUG40jTVzFh3FSSaSkBDwdEFDV7L4Kb1s4aUGOo0seYXlHlQSSegb5oT9kHMyT2A=]
00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-04T14:40:52



Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No.

CINCO

FECHA DE INICIO

20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO

04 DE DICIEMBRE DEL 2015

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KM 3.8 DE LA CARRETERA, SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO MPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION

PERIODO DEL EJECUCION

30 de Noviembre

UBICACIÓN :

SAN MIGUEL EL ALTO

ASIGNACION No.

SMA OP FP 2015 01

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO

IMPORTES

NOMBRE OBRA

(A) SUMA TOTAL	\$	25,862.07
(B) SUMA COSTO DIRECTO ESTA ESTIMACIÓN	\$	25,862.07
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	\$	25,862.07
(D) 16% DE I.V.A. (0.15 x C)	\$	4,137.93
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACIÓN (C+D)	\$	30,000.00
(F) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (25.0 %) DE (E)		
(G) 5 AL MILLAR		

(I) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F))

\$ 30,000.00

NETO A PAGAR (I-G)

\$ 30,000.00

AVANCES

FISICO

11.59%

FINANCIERO

11.59%

ESTADO CONTABLE

IMPORTE DE CONTRATO	\$	258,912.00
IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-

CONTRATO

ANTICIPO

ACUMULADO ANTERIOR	120,000.00	AMORTIZADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACIÓN	30,000.00	AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN	\$	-
ACUMULADO A LA FECHA	150,000.00	AMORTIZADO ACUMULADO	\$	-
SALDO	108,912.00	SALDO POR AMORTIZAR	\$	-
SALDO QUE SE CANCELA	0.00			

LUGAR Y FECHA : SAN MIGUEL EL ALTO A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA



ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ
H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

ESTIMACION DE OBRA

CINCO

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO OBRA: Reconstrucción de Camino Rural

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACIÓN: SAN MIGUEL EL ALTO

PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO

NOMBRE

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

PERIODO DE TRABAJO

30 de Noviembre

CUERPO DE ESTIMACIÓN

RCU	CONCEPTO	CANTIDADES					IMPORTE			
		UNI	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADOS ESTIMACIONES
No.										

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO										
1.-	Tendido de material subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (tractocompactor) en capas de 30cm. Incluye carga, descarga y acarreo del mismo.	m3	1,680.00	283.50	1,134.00	1,417.50	262.50	\$86.87 \$	24,627.78 \$	123,138.90
2.-	Nivelación de capa subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (Motoconformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	m2	5,600.00	670.81	2,683.24	3,354.05	2,245.95	\$1.84 \$	1,234.29 \$	6,171.45

SUMA PARCIAL ESTA ESTIMACION	\$25,862.07
16.0 % DEL I.V.A.	\$4,137.93
SUMA TOTAL ESTA ESTIMACION	\$30,000.00

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUÍZ

CONTRATISTA

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

GENERADORES DE OBRA



G O B I E R N O M U N I C I P A L 2 0 1 5 - 2 0 1 8



OBRA: Reconstrucción de Camino Rural

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

UBICACIÓN: KM 3.8 de la carretera San Miguel el Alto-Jalostotitlán al Relleno Sanitario Municipal.

CONTRATISTA: Ricardo Rodriguez Nieto

GENERADOR
05

NÚM	CONCEPTO	Localización		pza	Largo	Ancho	Alto	Uni	Result.	P. Unit.	Costo Total	
			ejes									
1.-	Tendido de material subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (tractocompactor) en capas de 30cm. Incluye carga, descarga y acarreo del mismo.	0+540	-	0+675	1.00	135.00	7.00	0.30	m3	283.50 \$	86.87 \$	24,627.78
2.-	Nivelación de capa subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (Motoconformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	0+422	-	0+518	1.00	95.83	7.00		m2	670.81 \$	1.84 \$	1,234.29
Subtotal =										\$	25,862.07	
IVA (16%) =										\$	4,137.93	
Total a Pagar =										\$	30,000.00	

Residente de Obra
Ricardo Rodriguez Nieto

Director de Obras Públicas
Ing. Gerardo Israel Larios Ruíz





Supervisor de Obras Públicas
Ing. Miguel Eduardo Sánchez Díaz



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Reporte Fotográfico

Reconstrucción de Camino Rural

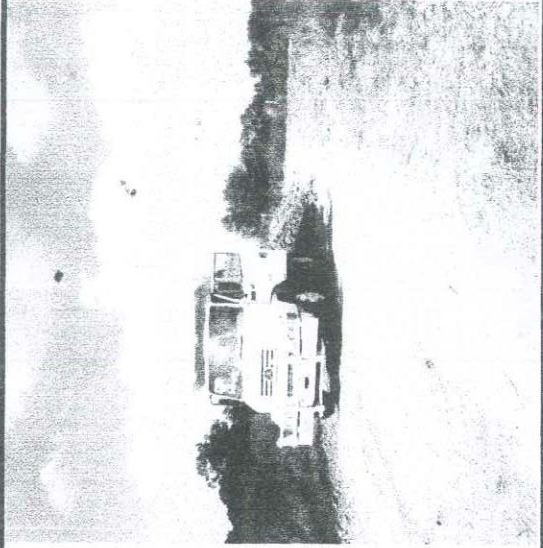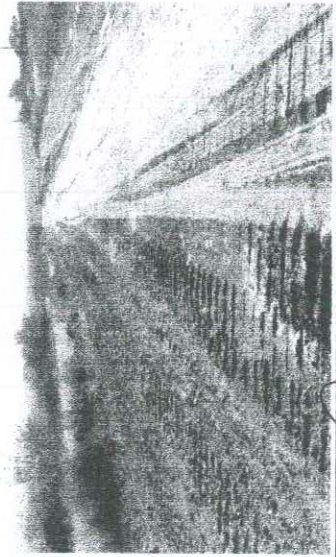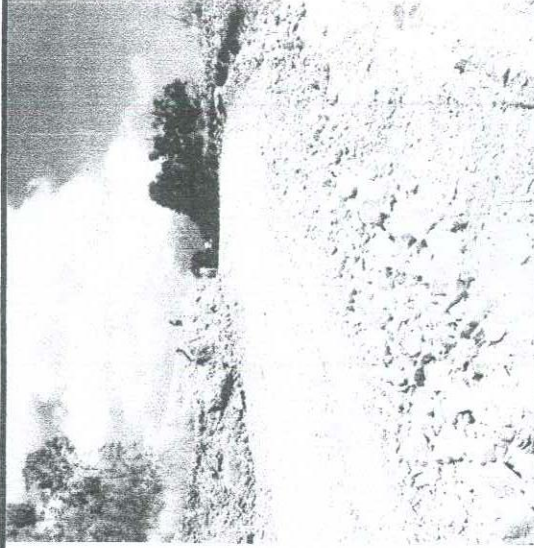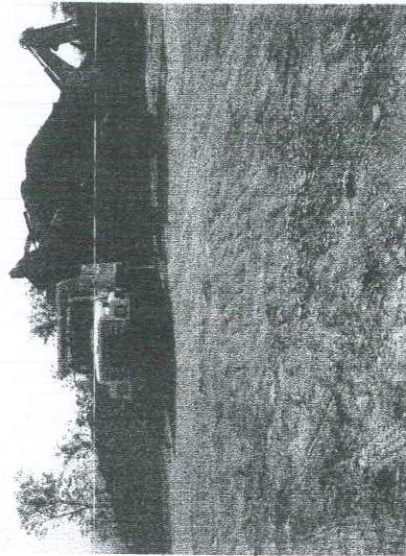

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

