

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZACION DE PAGO DE OBRA

L.A. MARCO ANTONIO VELEZ GOMEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

CONTRATISTA RICARDO RODRIGUEZ NIETO

OBRA
FECHARECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KILOMETRO 3.8 DE
LA CARRETERA SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO
MUNICIPAL" EN SAN MIGUEL EL ALTO
jueves, 17 de diciembre de 2015

POR ESTE CONDUCTO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA

ESTIMACION SEIS

POR UN MONTO TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE:

\$ 30,000.00

RECURSO	PROPIOS
CONTRATO N°	SMA-OPM-FP-2015-01
N° DE FACTURA	22
RETENCION 5 AL MILLAR (PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA)	\$ -
RETENCION 2 AL MILLAR (POR CAPACITACION CMIC)	\$ -

NETO A PAGAR

\$

30,000.00

ING. GABRIEL MARQUEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPALESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL
ALTO, JALISCO 2015-2018H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL EDUARDO SANCHEZ DIAZ

H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICASH. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
CONTRALORIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RFC Emisor : RONR790915S33

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle LOPEZ MATEOS No. Exterior 54 Colonia EL PUENTE Localidad
TEOCALTICHE Municipio TEOCALTICHE Estado Jalisco MEXICO CP. 47200

Sucursal :

RFC Receptor : MSM220422E73

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

Calle PORTAL INDEPENDENCIA No. Exterior 4 Colonia S/C Localidad SAN
MIGUEL EL ALTO Municipio SAN MIGUEL EL ALTO Estado Jalisco MEXICO
CP. 47140

Folio Fiscal:

4738E16F-7520-4112-B871-AFCFB7801FDB

No de Serie del CSD:

00001000000203518944

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TEOCALTICHE JALISCO 2015-12-16T16:32:45

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

22

Régimen Fiscal:

Regimen de las personas físicas con actividad
empresarial y profesional

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
262.50	N/A		MTS.3 CUBICOS DE TENDIDO DE CASCAJO, EXTRACCION, CARGA, DESCARGA Y ACARREO DEL MISMO (6TA. ESTIMACION)	86.87	22803.375
1662.27	N/A		MTS.2 CUADRADOS DE NIVELACION DE SUBRASANTE CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE DRENES LATERALES (6TA. ESTIMACION)	1.84	3058.5768
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 25,861.95
Moneda:				Impuestos Traslados	
Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION				Iva 16.00%	\$ 4,138.05
Método de Pago: CHEQUE					
Número de cuenta de Pago:					
Condiciones de Pago: CONTADO				TOTAL	\$ 30,000.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO
ACTA No.

10 NOV. 2015 - - - - 04
DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO.

Total con letra:

TREINTA MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

AF+AVqZ0qRiCvRKbpHf12LuXe3WmRK7Y3CFJRe0qY5kM5JaZ5MqxqKhErF6U8PSBEILHTUR5U/f1hd+DIK3E3tN
+bxW6gxVzlv0mU1B3fwCEXdrRaFzdbbCOMjdHqCx34ILr/kvipZGb9TWGT6A0z2J3d0XG9yNkkXKzOHG9w=

Sello del SAT:

y8u6LEB5w3qhAIS3fe1oyUecN1+3TWn+LqdAyNIQzpOO89lIrGmxRgkqD1M0FJYsbZ
+i/NkBUcC6M3Ue4OTqdeJT5FmguXrNSQ5AIPSlxRrFPHYPlsliCWAxuvMyq4o7rIXxZ1yevOXSBK0YPxARVIZHPJ05cBdCHEvsSCTHIU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4738E16F-7520-4112-B871-AFCFB7801FDB|2015-12-16T16:41:05|AF
+AVqZ0qRiCvRKbpHf12LuXe3WmRK7Y3CFJRe0qY5kM5JaZ5MqxqKhErF6U8PSBEILHTUR5U/f1hd+DIK3E3tN
+bxW6gxVzlv0mU1B3fwCEXdrRaFzdbbCOMjdHqCx34ILr/kvipZGb9TWGT6A0z2J3d0XG9yNkkXKzOHG9w=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-16T16:41:05



Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No.

SEIS

FECHA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO 04 DE DICIEMBRE DEL 2015

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KM 3.8 DE LA CARRETERA, SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO MPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA DE ESTIMACION

PERIODO DEL EJECUCION 01 de Diciembre del 2015

UBICACIÓN : SAN MIGUEL EL ALTO

ASIGNACION No. SMA OP FP 2015 01

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO

IMPORTES

NOMBRE OBRA

(A) SUMA TOTAL	\$	25,862.07
(B) SUMA COSTO DIRECTO ESTA ESTIMACIÓN	\$	25,862.07
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	\$	25,862.07
(D) 16% DE I.V.A. (0.15 x C)	\$	4,137.93
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACIÓN (C+D)	\$	30,000.00
(F) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (25.0 %) DE (E)		
(G) 5 AL MILLAR		

**ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL
ALTO, JALISCO 2015-2018**

(I) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F)) \$ 30,000.00

NETO A PAGAR (I-G) \$ 30,000.00

AVANCES

FISICO

11.59%

FINANCIERO

11.59%

ESTADO CONTABLE

IMPORTE DE CONTRATO	\$	258,912.00
IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-
CONTRATO		ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR	150,000.00	AMORTIZADO ANTERIOR \$ -
ESTA ESTIMACIÓN	30,000.00	AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN \$ -
ACUMULADO A LA FECHA	180,000.00	AMORTIZADO ACUMULADO \$ -
SALDO	78,912.00	SALDO POR AMORTIZAR \$ -
SALDO QUE SE CANCELA	0.00	

LUGAR Y FECHA : SAN MIGUEL EL ALTO A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS

ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ

CONTRATISTA

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

SES

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRA: Reconstrucción de Camino Rural

UBICACIÓN: SAN MIGUEL EL ALTO

PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO

NOMBRE

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

CUERPO DE ESTIMACIÓN



PERIODO DE TRABAJO

01 de Diciembre

[illegible]

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO										
1.-	Tendido de material subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (tractocompactor) en capas de 30cm. Incluye carga, descarga y acarreo del mismo.	m3	1,680.00	262.50	1,417.50	1,680.00	-	\$86.87	\$ 22,803.50	\$ 145,942.40
2.-	Nivelación de capa subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (Motoconformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	m2	5,600.00	1,662.26	3,354.05	5,016.31	583.69	\$1.84	\$ 3,058.57	\$ 9,230.02

SUMA PARCIAL ESTA ESTIMACION	\$25,862.07
16.0 % DEL I.V.A.	\$4,137.93
SUMA TOTAL ESTA ESTIMACION	\$30,000.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL
ALTO, JALISCO 2015-2018



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Ayuntamiento Constitucional
 Jalisco.
 Jalisco, el Alto, Jalisco.

ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUÍZ

CONTRATISTA

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

GENERADORES DE OBRA



G O B I E R N O M U N I C I P A L 2 0 1 5 - 2 0 1 8



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Reconstrucción de Camino Rural

UBICACIÓN: KM 3.8 de la carretera San Miguel el Alto-Jalostotitlán al Relleno Sanitario Municipal.

CONTRATISTA:

Ricardo Rodriguez Nieto

GENERADOR

06

NÚM	CONCEPTO	Localización		pza	Largo	Ancho	Alto	Uni	Result.	P. Unit.	Costo Total
		ejes									
1.-	Tendido de material subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (tractocompactor) en capas de 30cm. Incluye carga, descarga y acarreo del mismo.	0+675	-	0+800	1.00	125.00	7.00	0.30	m3	262.50	\$ 86.87 \$ 22,803.50
2.-	Nivelación de capa subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (Motoconformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	0+518	-	0+755	1.00	237.47	7.00	m2	1,662.26	\$ 1.84 \$ 3,058.57	
ESTADO DE DESEMPEÑO MUNICIPAL											
Subtotal =										\$	25,862.07
IVA (16%) =										\$	4,137.93
Total a Pagar =										\$	30,000.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL
ALTO, JALISCO 2015-2018



Residente de Obra
Ricardo Rodriguez Nieto

H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco
DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Carlos Ruiz

Supervisor de Obras Públicas
Ing. Miguel Eduardo Sánchez Díaz






G O B I E R N O M U N I C I P A L 2 0 1 5 - 2 0 1 8



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Reporte Fotográfico

Reconstrucción de Camino Rural

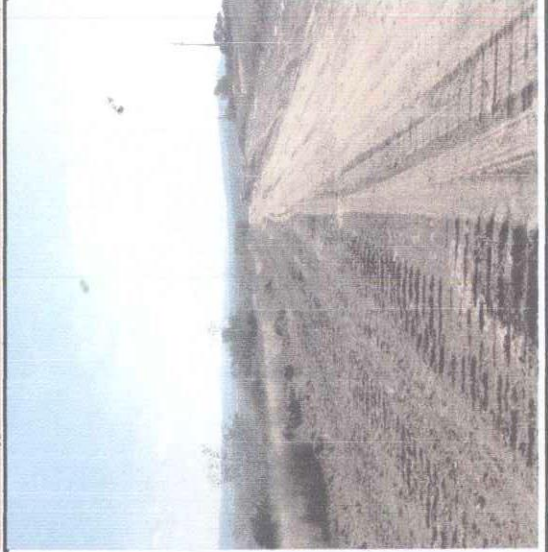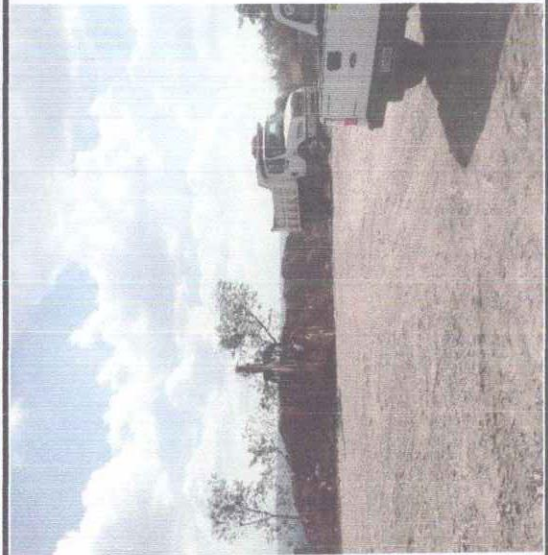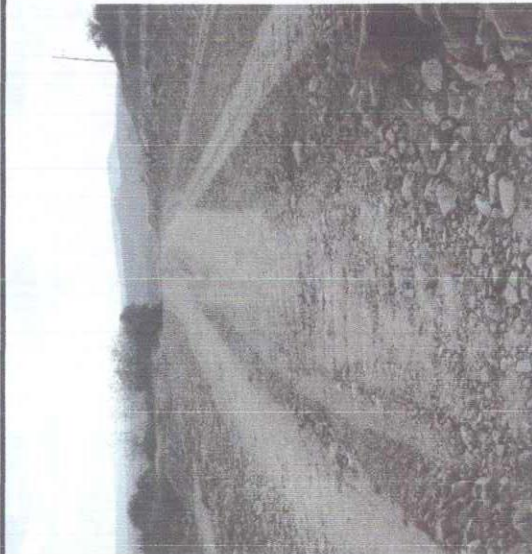

**ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL
ALTO, JALISCO 2015-2018**



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS
