



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



L.A. MARCO ANTONIO VELEZ GOMEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

CONTRATISTA RICARDO RODRIGUEZ NIETO

OBRA
FECHA

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KM 3.8 DE LA
CARRETERA SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO
MUNICIPAL," EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
miércoles, 23 de diciembre de 2015

POR ESTE CONDUCTO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ESTIMACION FINIQUITO
POR UN MONTO TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE:
\$ 78,912.00

RECURSO
CONTRATO N°
N° DE FACTURA

PROPIOS
SMA-OPM-FP-2015-01
24

RETENCION 5 AL MILLAR (PARA INSPECCION, CONTROL Y
VIGILANCIA)
RETENCION 2 AL MILLAR (POR CAPACITACION CMIC)

NETO A PAGAR

\$

78,912.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. GABRIEL MARQUEZ MARTINEZ
H. Ayuntamiento Constitucional
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ
H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DE OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco
DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL GUARDIA SANCHEZ DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA

PARA SU CONCIMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L.C.P. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ REYNOSO
H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RFC Emisor : RONR790915S33

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle LOPEZ MATEOS No. Exterior 54 Colonia EL PUENTE Localidad
TEOCALTICHE Municipio TEOCALTICHE Estado Jalisco MEXICO CP. 47200

Sucursal :

RFC Receptor : MSM220422E73

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

Calle PORTAL INDEPENDENCIA No. Exterior 4 Colonia S/C Localidad SAN
MIGUEL EL ALTO Municipio SAN MIGUEL EL ALTO Estado Jalisco MEXICO
CP. 47140

Folio Fiscal:

1D96BA50-C59E-42D6-B5B2-0F77A683EDCC

No de Serie del CSD:

00001000000203518944

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TEOCALTICHE JALISCO 2015-12-23T13:01:38

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

24

Régimen Fiscal:

Regimen de las personas físicas con actividad
empresarial y profesional

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
583.69	N/A		MTS2 DE NIVELACION DE CASCAJO	1.84	1073.9896
560	N/A		MTS3 TENDIDO DE TEPETATE	101.16	56649.60
5600	N/A		MTS2 DE NIVELACION DE BASE	1.84	10304.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 68,027.59

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE

IVA 16.00% \$ 10,884.41

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

TOTAL \$ 78,912.00

Total con letra:

SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

OingzKNyoSuVFmEQMYdi3B+6wrUr53AQXWITImbEVeMROcoCUEuGYUBWa3jS4EH4ajlPoFZJCy01YLkuQEFScJozvGJ0SENjzyc5Navuod8G9O2xQgte8+
+zFOjMA8KvGW97x0aVzbqgOUqs8taidCsrEn48ogogGflizJlOIE=

Sello del SAT:

dCuYneQbo7q8MkQjZHQTAIn8qCe9RLc8QTq1C4QuJ/vO91BJ/ztxooYznyEn9yNx1/885f0ucLOFKp4qih04bC/0NRF3Kdi/Wx4L4MUBYKlarUAaWJJE4fcGMOy2+EKmk3WMOvKSoOmS
fPyBwkuDdG051BUi8gvNu19DM5R/oo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1D96BA50-C59E-42D6-B5B2-0F77A683EDCC|2015-12-23T13:19:14|OingzKNyoSuVFmEQMYdi3B
+6wrUr53AQXWITImbEVeMROcoCUEuGYUBWa3jS4EH4ajlPoFZJCy01YLkuQEFScJozvGJ0SENjzyc5Navuod8G9O2xQgte8+
+zFOjMA8KvGW97x0aVzbqgOUqs8taidCsrEn48ogogGflizJlOIE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-23T13:19:14



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No.

SIETE - FINQUITO

FECHA DE INICIO

20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO

04 DE DICIEMBRE DEL 2015

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KM 3.8 DE LA CARRETERA, SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO MPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION

PERIODO DEL EJECUCION

02 a 04 de Diciembre del 2015

UBICACIÓN :

SAN MIGUEL EL ALTO

ASIGNACION No.

SMA OP FP 2015 01

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO

IMPORTES

NOMBRE OBRA

(A) SUMA TOTAL	\$	68,027.59
(B) SUMA COSTO DIRECTO ESTA ESTIMACIÓN	\$	68,027.59
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	\$	68,027.59
(D) 16% DE I.V.A. (0.15 x C)	\$	10,884.41
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACIÓN (C+D)	\$	78,912.00
(F) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (25.0 %) DE (E)		
(G) 5 AL MILLAR		

(I) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F)) \$ 78,912.00

NETO A PAGAR (I-G) \$ 78,912.00

AVANCES

FISICO

30.48%

FINANCIERO

30.48%

ESTADO CONTABLE

IMPORTE DE CONTRATO	\$	258,912.00
IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-

CONTRATO

ANTICIPO

ACUMULADO ANTERIOR	180,000.00	AMORTIZADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACIÓN	78,912.00	AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN	\$	-
ACUMULADO A LA FECHA	258,912.00	AMORTIZADO ACUMULADO	\$	-
SALDO	0.00	SALDO POR AMORTIZAR	\$	-
SALDO QUE SE CANCELA	0.00			

LUGAR Y FECHA : SAN MIGUEL EL ALTO A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA



ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ
 H. Ayuntamiento Municipal
 San Miguel el Alto, Jalisco.
 DIRECCION MUNICIPAL
 DE OBRAS PUBLICAS

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

ESTIMACION DE OBRA

SIETE

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRA: Reconstrucción de Camino Rural

UBICACIÓN: SAN MIGUEL EL ALTO

PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO

NOMBRE

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

CUERPO DE ESTIMACIÓN

PERIODO DE TRABAJO

02 a 04 de Diciembre



RCU	CONCEPTO	UNI	CANTIDADES					IMPORTES		
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADOS ESTIMACIONES
No.										
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO									
1.-	Nivelación de capa subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (Motoconformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	m2	5,600.00	583.69	5,016.31	5,600.00	-	\$1.84 \$	1,073.99 \$	10,304.01
2.-	Tendido de material de base (tepalcate) con maquinaria pesada (tractocompactor) en capa de 10cm. Incluye carga, descarga y acarreo del mismo.	m3	560.00	560.00	-	560.00	-	\$101.16 \$	56,649.60 \$	56,649.60
3.-	Nivelación de capa de base (tepalcate) con maquinaria pesada (Motoconformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	m3	5,600.00	5,600.00	-	5,600.00	-	\$1.84 \$	10,304.00 \$	10,304.00

SUMA PARCIAL ESTA ESTIMACION	\$68,027.59
16.0 % DEL I.V.A.	\$10,884.41
SUMA TOTAL ESTA ESTIMACION	\$78,912.00



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.

DIRECCIÓN MUNICIPAL

ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUÍZ

CONTRATISTA

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

GENERADORES DE OBRA



G O B I E R N O M U N I C I P A L 2 0 1 5 - 2 0 1 8



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Reconstrucción de Camino Rural

UBICACIÓN: KM 3.8 de la carretera San Miguel el Alto-Jalostotitlán al Relleno Sanitario Municipal.

CONTRATISTA:

Ricardo Rodriguez Nieto

GENERADOR

07

NÚM	CONCEPTO	Localización		pza	Largo	Ancho	Alto	Uni	Result.	P. Unit.	Costo Total
			ejes								
1.-	Nivelación de capa subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (Motoconformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	0+755	-	0+800	1.00	83.38	7.00	m2	583.69	\$ 1.84	\$ 1,073.99
2.-	Tendido de material de base (tepetae) con maquinaria pesada (tractocompactor) en capa de 10cm. Incluye carga, descarga y acarreo del mismo.	0+000	-	0+800	1.00	800.00	7.00	m3	560.00	\$ 101.16	\$ 56,649.60
3.-	Nivelación de capa de base (tepetae) con maquinaria pesada (Motoconformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	0+000	-	0+800	1.00	800.00	7.00	m2	5,600.00	\$ 1.84	\$ 10,304.00
Subtotal =										\$	68,027.59
IVA (16%) =										\$	10,884.41
Total a Pagar =										\$	78,912.00



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Gerardo Israel Larios Ruíz

Supervisor de Obras Públicas
Ing. Miguel Eduardo Sánchez Díaz

Residente de Obra
Ricardo Rodríguez Nieto





G O B I E R N O M U N I C I P A L 2 0 1 5 - 2 0 1 8



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Reporte Fotográfico

Reconstrucción de Camino Rural

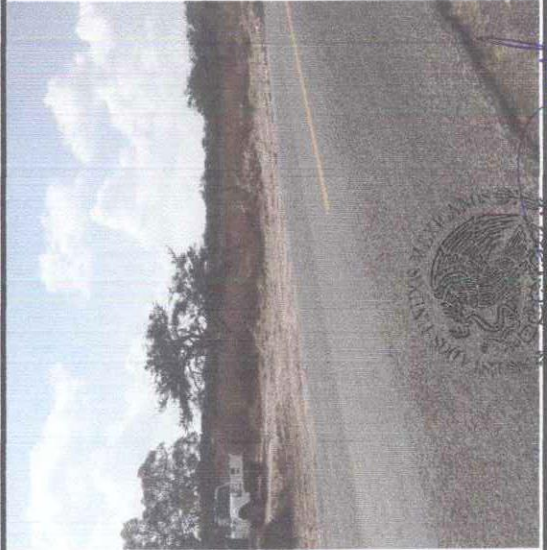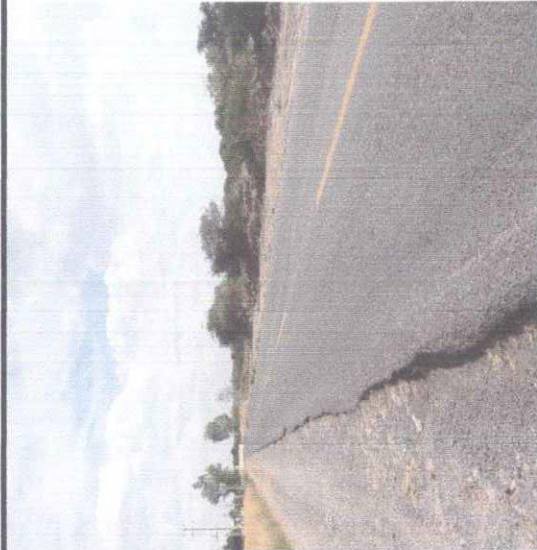

Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma manuscrita]
